Blog Gestion de Projet

GUIDE PRATIQUE

PILOTEZ EFFICACEMENT VOS PROJETS

+40 problèmes de gestion de projet et leurs **solutions**

https://blog-gestion-de-projet.com

Blog Gestion de Projet

Copyright ©, Brainit Consulting Ltd

Tous les droits sont réservés, diffusion et reproduction interdites

Vous n'avez pas le droit de partager les éléments de ce guide. Il est réservé à un usage strictement personnel.

Brainit Consulting Ltd se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi en cas de non-respect de ces conditions.

Blog Gestion de Projet

SOMMAIRE

02 Chapitre 1 - Cadrage

10 Chapitre 2 - Intégration

18 Chapitre 3 - Périmètre

25 Chapitre 4 - Planification

30 Chapitre 5 - Coûts

37 Chapitre 6 - Qualité

42 Chapitre 7 - Ressources humaines

49 Chapitre 8 - Communication

54 Chapitre 9 - Gestion des risques

58 Chapitre 10 - Approvisionnements

64 Chapitre 11 - Parties prenantes

69 Conclusion

AVANT-PROPOS

Malgré tout le soin que nous apportons à nos projets, il nous arrive de faire face à des problèmes qu'il faudra résoudre pour mener nos initiatives à bon port.

Nous partageons sur notre site Blog-Gestion-de-Projet.com, beaucoup d'enseignements et de recommandations pour éviter un bon nombre de situations de blocage, mais malheureusement, le monde est ainsi fait que le risque zéro n'existe pas.

Nous abordons donc dans cet ouvrage, un certain nombre de situations et de problèmes que vous devrez régler pour débloquer et réussir vos projets.

Il s'agit en effet d'un guide pratique, qui complète les ressources déjà disponibles sur notre site, conçu dans le but de vous aider à trouver des solutions simples à des problèmes parfois complexes.

Les solutions proposées sont basées sur les expériences du terrain et ont permis de sortir des projets de situations bloquantes ou à risques.

L'objectif est de sortir du cadre théorique pour partager avec le lecteur le fruit de plusieurs années d'expérience dans la gestion de projets moyens et majeurs.

Malgré tout, il nous est apparu que bien des problèmes pouvaient être évités grâce à quelques règles de bases et une documentation projet déjà partagées avec nos lecteurs via notre Blog.

Pour n'en citer que les principaux :

- La Charte de Projet
- Le Cahier des Charges
- Le Registre des Risques
- Le Plan de Communication

Ces documents devraient vous épargner bien des tracas.

Nous espérons que les ficelles partagées dans cet ebook vous aideront à délivrer vos projets et les emmener avec succès à la satisfaction de vos clients.

N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, commentaires et questions, afin que tous ensemble, nous contribuions au développement de notre communauté.

Bonne lecture !

Chapitre 1 - Problèmes liés au cadrage en amont du projet : à la vision du projet, à la clarté des objectifs à atteindre

Un projet qui n'a pas été bien cadré dès le départ va, sans aucun doute, créer des problèmes durant son exécution.

Il est malheureusement fréquent que dans l'excitation de mettre en place le nouveau produit, la nouvelle idée ou les nouvelles solutions, on court-circuite cette **phase essentielle de préparation** – et qu'on en paie le prix fort par la suite.

Pour éviter ce piège, n'hésitez pas à consulter nos articles concernant la phase d'initialisation des projets.

Que ce soit pour les petits ou les gros projets, prenez le temps de créer - et de faire signer par toutes les parties – une « charte projet » reprenant les informations indispensables au cadrage du projet :

- **Vision et objectifs** – pour fédérer les parties prenantes
- **Périmètre** – pour clarifier le produit ou résultat qui sera livré
- **Hors périmètre** – indispensable pour comprendre ce qui ne fera pas partie de ce projet
- **Coûts** – une estimation initiale qui sera affinée par la suite
- **Calendrier** – quelles seront les grandes étapes du projet et la date prévue de livraison
- **Équipe** – qui va travailler sur cette nouvelle initiative ?

La Charte de projet ne doit pas être un long document que personne ne lira – elle doit au contraire être aussi succincte que possible, une seule page par exemple, afin que tout le monde ait l'occasion de la parcourir entièrement et de la signer en toute connaissance de cause.

Ce document vous évitera certainement un bon nombre de problèmes tels que :

1. **Ambiguïté et démotivation**
2. **Lancement du projet sans étude préalable**
3. **Compréhensions différentes des objectifs et du périmètre**
4. **Évolution des objectifs**

Voici ci-après des solutions pour chacune de ces problématiques.

1 Ambiguïté et démotivation

L'équipe ne sait pas pourquoi elle fait le projet, ne connait pas les enjeux business, et donc n'est pas au top de sa motivation.

Vous avez ici un problème évident de communication : votre équipe n'est pas fédérée autour d'une vision et d'objectifs précis. Que faire ?

💡 Fédérez l'équipe autour de la charte

Il n'est pas trop tard pour revenir à la source et faire une charte commune – cette fois avec la participation de toute l'équipe afin de profiter de l'exercice pour répondre à toutes les questions.

Ce retour à la base peut vous coûter du temps que vous pensez être trop précieux.
Mais c'est un investissement indispensable pour éviter de bien plus gros problèmes par la suite.

Assurez-vous de l'existence d'une étude d'opportunité

Assurez-vous qu'une étude d'opportunité a été faite. Que l'on n'a pas sous-estimé les coûts et surestimé les bénéfices.

Une équipe qui n'a pas compris en détail le pourquoi, le comment et la nature, de ce qu'elle va délivrer, aura de très fortes chances de ne pas délivrer le résultat attendu par le client final, qu'il soit interne ou externe.

Ce ne sera plus un problème, mais une catastrophe pour tout le monde.

N'hésitez dons pas à tout arrêter.

Prenez le temps de répondre à toutes les questions.

Assurez-vous que cette fois, tout le monde a compris et que la motivation est revenue.

2 Lancement du projet sans étude préalable

La viabilité et la faisabilité du projet n'ont pas été démontrée (business case), et pourtant le projet est déjà officiellement lancé.

Comment dois-je réagir en tant que chef de projet ?

Cela arrive malheureusement trop souvent.

Et pour être honnête, c'est parfois un casse-tête pour ne pas passer pour un rabat-joie alors que les décideurs sont si motivés à mettre en place cette nouvelle initiative au plus tôt.

Il y a plusieurs pistes possibles :

- Si c'est possible, **proposez de commencer par un prototype** dont le coût sera bien moindre tout en vous permettant de valider l'idée d'origine et son impact
- **Organisez des réunions avec les parties prenantes clés**. Cela vous permettra d'affiner les bénéfices estimés et donc de le chiffrer, avec l'aide de représentants de la Finance
- **Comprenez l'appétence aux risques de votre management** : le produit ou résultat espéré vaut-il le risque financier ? L'avantage concurrentiel potentiel présente-t-il des opportunités de marché non couvertes jusqu'ici?
- **Voyez comment découper votre projet en tranches** permettant la mise en place de barrières financières et fonctionnelles. En faisant coïncider ces tranches avec des comités de direction, vous pourrez régulièrement valider à la fois la disponibilité des budgets et l'adéquation du produit aux besoins réels.
- **Refuser d'avancer me semble être la plus mauvaise des solutions**, car si certaines parties prenantes seront d'accord (souvent parce qu'elles étaient contre le projet dès le départ), d'autres se sentiront trahies et risquent d'essayer de trouver des solutions externes pour arriver à leur fin.

Dans tous les cas, cette situation fera appel à vos talents de négociateur/trice et à votre aptitude à mettre en place le meilleur compromis possible pour l'organisation.

N'hésitez pas à consulter nos articles sur le site, sur les plans de communication et les talents d'un bon Chef de Projet.

https://blog-gestion-de-projet.com/plan-de-communication-projet/
https://blog-gestion-de-projet.com/un-chef-de-projet-est-il-un-leader-ou-un-manager/

3 Compréhensions différentes des objectifs et du périmètre

Si l'on ne prend pas soin de vérifier que toutes les parties prenantes soient bien alignées sur les objectifs et le périmètre du projet, on prend le risque de perdre énormément de temps à expliquer et à réexpliquer le comment et le pourquoi de l'initiative.

Malheureusement, ce cas de figure peut se présenter même quand on a une charte de projet, si celle-ci laisse la place à l'interprétation.

C'est pour cela que les objectifs doivent être très clairs, mesurables et spécifiques. Laisser la place à l'interprétation, c'est ouvrir la porte à de nombreuses déconvenues et retards divers.

De même, le périmètre doit être complété par la notion de «**hors périmètre**» afin de cadrer ce sur quoi nous allons travailler – et ce qui ne sera pas fait durant ce projet - afin de gérer au mieux les attentes des parties prenantes.

Comprenez la source et l'étendue du problème

Si, malheureusement, vous faites face à un tel problème, ne le sous-estimez surtout pas. Tenter de le résoudre rapidement par de simples réunions, courriels ou appels téléphoniques pourrait même accentuer le problème.

Au contraire, arrêtez-vous et prenez vraiment le temps de comprendre l'étendue du problème de communication et son origine.

Lorsque vous saurez quels départements ou services sont concernés et à quel moment les avis et compréhension se sont éloignés, vous pourrez alors rassembler tout le monde et corriger le tir.

Un réalignement peut être nécessaire

Il y a de grandes chances que la mécompréhension soit plus généralisée que vous ne le pensiez à l'origine et qu'un réalignement complet soit nécessaire.

Ne soyez pas effrayés du travail de réalignement : des équipes totalement synchronisées sont bien plus efficaces et le temps investi sera récupéré de multiples fois.

Parfois, ce manque d'alignement se passe entre votre organisation et un bureau/fournisseur externe, ou votre entreprise de services préférée. Voire pire : le client a soit changé d'avis, soit mal compris vos propositions.

Allez les voir. Discutez avec eux de leur compréhension des objectifs afin d'identifier les divergences et de les corriger.

Si vous avez au sein de votre organisation un(e) Responsable du Changement, faites-vous accompagner.

Ces réunions de cadrage changent souvent la donne et permettent aux parties de mieux se comprendre et de mieux travailler ensemble.

Même si parfois, vous devrez avouer une erreur de votre part, la cohésion du projet et son succès vont dépendre de cet alignement total et sans faille.

4 Evolution des objectifs

Le cauchemar de tout chef de projet : On s'est mis d'accord pour faire quelque chose, mais on change d'avis en cours de route.

Parfois, malgré tout, ces changements sont liés à des évolutions de marché ou à des changements de stratégie de l'entreprise.

Pas besoin alors de trop se battre, car nous travaillons tous au développement de l'entreprise pour laquelle notre projet a été défini.

Je dirais même qu'il faut **accueillir le changement positivement**, notamment lorsqu'il est issu d'une réflexion sur les vrais besoins des utilisateurs.

Documentez les impacts et faites valider les changements

Mais attention, avant d'intégrer ces changements et adapter les solutions en conséquence, il va falloir documenter les impacts en termes de délais, de périmètre et de budget – et faire approuver ces modifications par le comité de pilotage.

Si par contre ces changements d'objectifs font suite à la pression de certaines parties prenantes clés, les changements DOIVENT être entérinés de manière officielle.

La procédure est similaire à celle-ci-dessus, mais il faut s'attendre à de nombreuses discussions entre les parties, et les impacts négatifs ou positifs doivent être documentés de manière détaillée.

Le chef de projet doit rester impartial

Il sera difficile pour le chef de projet de rester impartial et pourtant, c'est la recommandation principale que je peux faire.

Ce type de négociation autour des changements d'objectifs doit se faire de manière extrêmement circonstanciée pour éviter des discussions trop émotionnelles.

Quelle que soit l'issue retenue par le comité de pilotage, les décisions devront être factuelles, précises et toujours dans l'intérêt de l'entreprise avant tout.

Je sais à quel point cela peut être difficile pour un chef de projet, mais ce type de problème est très fréquent et demande des décisions impartiales.

Chapitre 2 - Problèmes liés à l'intégration du projet

Les problèmes d'intégration sont le plus souvent liés à une phase d'Initialisation incomplète ou inexistante.

Ce sont des problèmes qui vont souvent demander une pause dans le projet car il ne faut surtout pas continuer le travail quand des membres importants de l'équipe ont perdu ce qui aurait dû être leur fil conducteur dès le début de l'exécution.

Souvent, la source se trouve dans l'absence de charte, de vision et d'objectifs commun.



Parfois, c'est un manque de communication. N'oubliez pas que la communication doit se faire dans les deux sens entre l'émetteur et le récepteur.

Sans retour des auditeurs, comment s'assurer que les messages ont été perçus tels qu'ils étaient pensés au départ ?

Ne pas vérifier la compréhension – et l'acceptation – de nos messages, c'est bien sûr prendre le risque que chaque individu l'ait compris à sa manière, avec son propre ressenti et vécu.

Les membres d'une équipe se groupent souvent entre collègues et connaissances. Entre eux, ils sont souvent d'accord – et peuvent faire front face à d'autres collègues partageant d'autres opinions.

L'équipe projet devient alors un réseau de poches d'influences – que le chef de projet doit absolument transformer en influences positives pour le projet grâce à un nouvel esprit d'équipe autour d'une vision commune.

1 Les équipes ne sont pas d'accord entre elles sur ce qui est à faire

Avant tout : ne sous-estimez pas cette situation car l'impact sur votre projet peut devenir extrêmement grave.

Écoutez vos équipes

Rassemblez vos équipes, encouragez chacun à exprimer ce qu'il/elle pense et pourquoi les choses doivent être faites de telle manière d'après leur perception.

Rappelez les objectifs de la charte de projet

Revenez à la vision et aux objectifs définis par la charte de projet, et si besoin est, corrigez les mots ambigus ou incomplets de la vision.

Vérifiez ensuite, avec l'équipe, si tous les objectifs sont clairs pour tous, et faites des corrections si nécessaire.

Il est important qu'à l'issue de cette réunion, chaque personne présente ait approuvé la nouvelle version, leur nouvelle vision commune.

Si vous n'aviez pas de charte ou de note de cadrage de projet, alors développez-là tous ensemble, en pesant bien chaque mot et en respectant la liste du chapitre 1.

Que vous ayez modifié la charte ou que vous en ayez développé une nouvelle, assurez-vous aussi que les parties prenantes clés l'aient approuvée au même titre que chaque membre de l'équipe.

Vous pourrez dès lors, redémarrer votre projet sur de nouvelles bases.

2 Les livrables souhaités ne sont pas clairs

Lors de la phase d'Initialisation d'un projet, il n'y a pas que la Charte qui soit importante, il y a aussi l'Expression des besoins – qui servira de base à l'élaboration du cahier des charges lors de la phase de planification.

Ce **cahier des charges** doit être suffisamment détaillé pour éviter toute discussion future – mais malheureusement, il se peut que les lectures du cahier des charges aient été comprises de différentes manières.

Et sans cahier des charges, il est bien sûr fréquent que les thèmes du contenu et de la finalité des livrables fassent l'objet de discussions animées.

Le problème, c'est que sans cahier des charges, les discussions risquent de partir de zéro et avoir un impact sur votre planning.

Si c'est un livrable en particulier qui n'est pas clair, rassemblez les équipes concernées et assurez-vous qu'ensemble elles trouvent la meilleure solution pour le projet et l'entreprise.

Si les discussions couvrent plusieurs voire l'ensemble des livrables, vous avez un problème de fond et ici encore, il va falloir faire une pause avant de reprendre le projet.

Vous ne pouvez pas continuer un projet dont les livrables ne sont pas clairs.

💡 Appliquez la démarche STEP

Les anglais vont appeler ce que vous devez faire STEP (*) :

S	T	E	P
Stop Arrêtez	**Think** Pensez	**Evaluate** Évaluez (la situation et la solution)	**Proceed** Continuez

Effectivement ; il faut tout arrêter pour réfléchir à ce qui a provoqué cette situation, évaluer ce qui se passe et comment on peut le régler avant de continuer.

(*) Utilisez la version anglaise STEP pour cette procédure, APEC étant déjà réservé à bien autre chose

Si vous avez un cahier des charges, il a peut-être été trop général, pas assez détaillé.

Si vous n'en avez pas, ne cherchez pas plus loin la source de votre ou vos problème(s).

Quoiqu'il en soit, c'est ensemble qu'il faudra le régler en créant ou en corrigeant un document auquel toute l'équipe aura participé et que toute l'équipe endossera comme le (nouveau) document de référence.

Vous verrez alors que le résultat sera non seulement un nouveau document solide mais aussi une équipe ressoudée et revigorée pour continuer.

Les crises dans un projet ont parfois des résultats très surprenants.

Les résultats d'un STEP sont souvent extrêmement positifs pour la suite du projet.

3 Qui fait quoi ?

Les parties prenantes **se rejettent la responsabilité** sur les périmètres ou à l'inverse **se disputent les prérogatives** et le champ d'action.

Si vous faites face à ce type de problème, il y a fort à parier que la phase d'Initialisation aura été sous-estimée, incomplète ou inexistante.

De même pour la partie planification.

Clarifiez les rôles et responsabilités

Un **registre des parties prenantes** vous aidera à bien identifier qui participe, est impacté ou doit être tenu au courant du projet.

Ce même registre aura identifié les membres à temps complet ou à temps partiel du projet.

Et une **matrice RACI** définira pour chacun d'eux les responsabilités à l'intérieur de l'équipe.

Tout cela peut ne pas être clair pour tous ou ne pas avoir été communiqué assez largement.

- https://blog-gestion-de-projet.com/parties-prenantes-de-projet/
- https://blog-gestion-de-projet.com/quest-ce-que-la-matrice-raci/

Favorisez la communication au sein de l'équipe

Ici encore, rassemblez vos équipes, faites le point et récoltez leurs doléances. Après tout, l'erreur peut venir de vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'admettre et corrigez la situation et la documentation tous ensemble.

Une équipe ne sera soudée que si chacun de ses membres a la latitude et l'opportunité de donner son avis sans craindre de se heurter à des réactions négatives voire même à des sanctions.

Les meilleures équipes sont les équipes où chacun s'exprime avec franchise.

A l'issue de ces réunions, documentez les changements et le cas échéant, communiquez au comité de pilotage les modifications apportées avec l'aide de votre équipe d'experts.

4 Le manque de gouvernance

Pour éviter tout problème de gouvernance, documentez dès le départ vos instances de contrôle, soit de haut en bas : le Comité de Pilotage, Le Comité de projet, les réunions de suivi, etc.

Pour chacune de ces réunions, donnez les noms des participants et les responsabilités de chacune de ces instances.

Si vous n'avez pas mis en place cette gouvernance et que vous rencontrez des problèmes, il sera difficile de prendre les bonnes décisions.

Créez un schéma de gouvernance

Ceci dit, il est préférable de créer cette gouvernance après coup que de naviguer entre les services de directions pour essayer de contrôler la bonne marche de votre projet.

Comme pour tout ce dont nous parlons ici, la gouvernance s'adaptera à la taille de l'entreprise et à ses besoins.

Certaines entreprises ont des instances de prise de décisions très courtes, d'autres souffrent d'une complexité matricielle qui impose des comités plus importants.

Mais un plan et des instances de gouvernance sont incontournables à la réussite des projets.

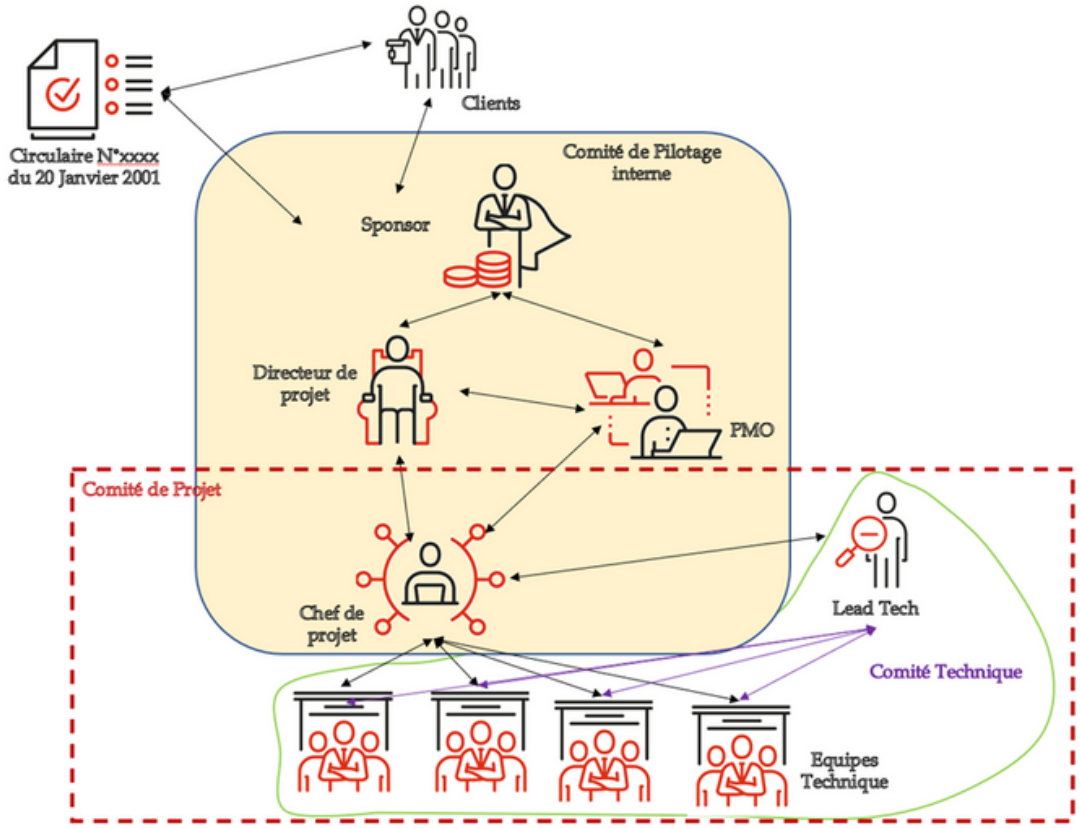

Télécharger cet exemple au format ppt :

https://blog-gestion-de-projet.com/gouvernance-de-projet/

Chapitre 3 - Problèmes liés au périmètre du projet

Les problèmes liés au périmètre sont malheureusement fréquents dans un projet.

Lorsqu'ils sont le fruit de la mise en place d'un prototype, ils sont le plus souvent bénéfiques au projet car ils vont permettre de corriger des assomptions incorrectes et remettre le projet sur la bonne voie.

Il arrive rarement que l'on se soit trompé sur toute la ligne – mais le remarquer au plus tôt permettra soit de corriger le cahier des charges, soit d'arrêter le projet avant d'avoir dépensé trop de ressources et d'argent.

Malheureusement, les changements de périmètre sont parfois aussi le fruit de nouvelles demandes, justifiées ou non, de parties-prenantes-clés qui veulent profiter du projet pour obtenir des fonctionnalités ou produits finis qui ne faisaient pas partie des accords initiaux.

On retrouve ici encore l'utilité d'une Charte et d'un Cahier des Charges qui peuvent nous servir à refuser les demandes hors périmètre ou celles qui feront exploser nos budgets.

S'il le faut, ce type de discussions peut se faire avec le comité de pilotage car c'est celui-ci qui tranchera en faveur ou en défaveur des changements majeurs.

Quoi qu'il en soit, les changements de périmètre touchent à un des côtés du Triangle d'Or, (La triple contrainte Qualité-Coût-Délais).

Ce qui implique un impact direct sur les accords de départ. Et cet impact doit être approuvé par le comité de pilotage, seul habilité à trancher.

Voyons ci-après quelques exemples de problèmes liés au périmètre :

1 Les nouvelles demandes affluent

Ce phénomène est appelé le « scope creep »; ce qui signifie dérive du périmètre. Un classique.

Le plus souvent, certaines parties prenantes en profitent pour essayer d'intégrer au projet leurs propres désirs.

Parfois, ils sont justifiés et parfois leur impact sur la triple contrainte peut mettre l'ensemble du projet en danger.

La question fréquente est donc : dois-je refuser et selon quels critères ?

J'aurais tendance à conseiller d'accepter les demandes qui apportent de la valeur ajoutée au moindre coût.

Et de refuser les demandes qui sortent des accords et vont avoir un impact négatif mesurable sur le triangle d'or.

Mesurez l'impact de la demande sur le coût et les délais

J'utilise le mot « mesurable » car les discussions concernant le périmètre sont parfois émotionnelles et parce que le meilleur moyen de prendre une bonne décision est de mesurer son impact sur le coût et le temps assignés au projet.

Comme d'habitude, la Charte et le Cahier des charges vont nous aider à baser les discussions sur des faits documentés et approuvés.

Et si les discussions n'aboutissent pas, on ajoutera ce risque au calendrier du Comité de Pilotage - en apportant au support de discussion toutes les mesures et projections permettant aux dirigeants de prendre la bonne décision.

Documentez les changements

Lorsque le comité de pilotage a accepté le changement de périmètre, il sera bien sûr indispensable d'apporter les changements nécessaires au planning et au budget (coûts/bénéfices) – et de les noter comme un changement des accords initiaux.

Cette documentation est essentielle pour la bonne suite du projet, la documentation des leçons apprises et l'archivage en fin de projet.

2 Le périmètre change

Le périmètre n'arrête pas de changer, on diverge des objectifs initiaux.

Une situation fort gênante pour le projet, car ce sont tous les accords initiaux qui sont remis en question : le planning, le budget et le périmètre. Cela sans compter l'impact négatif sur la motivation de l'équipe.

Pas d'autre choix ici que de tout mettre en pause. Continuer sur cette voie, c'est l'échec complet assuré.

C'est le moment de faire un « **STEP** » comme expliqué plus haut lorsque les livrables ne sont pas clairs.

Prévenez le Comité de Pilotage de cette procédure exceptionnelle et accordez-vous pour une réunion commune afin de faire un rapport complet de vos investigations.

- **Arrêtez** tout, mettez le projet en pause. À partir de maintenant, tout le monde est mobilisé pour trouver la source du/des problème(s) et pour trouver des solutions
- **Pensez** ensemble à ce qui vous a amené à cette situation. Avec l'aide de l'équipe, pensez à tout ce qui a pu provoquer cette situation. Il se peut que ce soit interne à l'équipe, mais le plus souvent, ce genre de situation est un dysfonctionnement de l'organisation. Écoutez chacun, notez soigneusement chaque retour et catégorisez-les. Il va falloir les prioriser et les résoudre pour pouvoir redémarrer.
- **Estimez** chaque élément qui a mené à cette situation et trouvez des solutions pour les éviter dans le futur. C'est un travail d'équipe, n'hésitez pas à faire appel à votre équipe projet, à vos collègues et à votre sponsor.
- **Continuez**, lorsque votre plan de « récupération » aura été expliqué en détail et approuvé par le comité de direction. Rassemblez votre équipe et accordez-vous tous ensemble sur la nouvelle base de travail en renforçant l'esprit d'équipe autour de nouveaux objectifs communs.

Grâce à cette approche, vous aurez très probablement ressoudé les liens et sauvé votre projet.

2 Les attentes sont irréalisables

J'ai une Charte et un Cahier des Charges, comment cela peut-il m'arriver ?

En fait, c'est une dérive du périmètre initial qui peut vous mettre dans cette situation. Une lecture différente des objectifs, appelée en anglais « **Gold plating** » ou plaquage d'or.

Refusez certaines demandes irréalisables

Une ou plusieurs des parties prenantes a (ont) des aspirations très hautes du nouveau produit ou service.

Une version « plaquée or » qui ne correspond ni au budget, ni au cahier des charges.

Or, ces attentes peuvent s'avérer irréalisables et malgré l'insistance de la partie prenante, il vous faut refuser ces demandes en expliquant pourquoi elles ne peuvent pas faire partie de votre projet.

Il se peut que ce genre de discussions se terminent en comité de pilotage.

Justifiez votre refus

Lorsque vous défendez votre point de vue, expliquez non seulement pourquoi il vous faut refuser, mais aussi les multiples conséquences d'accéder à ces demandes – sur le périmètre, les coûts ainsi que l'impact qu'aurait l'initiative sur l'ensemble de l'entreprise.

Le comité de pilotage est toujours l'instance ultime pour les décisions importantes – et ces décisions sont prises en fonction de votre expertise et de vos recommandations.

3 Où sont les limites de notre projet ?

Si on vous pose cette question, c'est probablement que votre projet a dérivé.

💡 N'oubliez pas de spécifier les « Hors périmètre »

Rappelez-vous, la Charte doit aussi spécifier ce qui est HORS périmètre.

C'est une des façons de vous protéger de cette question et des dérives de votre initiative.

Pourtant, il arrive encore que certaines fonctionnalités soient ajoutées sous la pression et que le projet soit sorti du cadre défini à l'origine.

Pour le recadrer, il vous faudra revenir aux accords initiaux, revoir les changements approuvés par le comité de pilotage et comprendre à quel moment les limites du projet ont été dépassées.

Ces limites devront être redéfinies et réapprouvées par le comité de pilotage et les parties prenantes.

L'accent sera alors porté sur le Hors Périmètre – ce qu'on ne pourra en aucun cas délivrer sans mettre en danger l'ensemble du projet.

💡 Transformez les demandes supplémentaires en un nouveau projet

Proposez de noter les demandes supplémentaires et d'en faire un projet suivant ou une vague suivante de votre projet – dont il faudra renégocier le périmètre, les coûts et le temps.

Transformez ce problème en opportunité future pour l'entreprise.

Chapitre 4 - Problèmes liés à la planification et la gestion du temps du projet

1 Le client exige un planning très engageant

L'exemple ici implique que le client exige un planning très engageant, car les enjeux business sont énormes.

Or, je ne peux lui donner une réponse positive à cause de dépendances externes ou de projets prioritaires à hauts risques.

Ce cas de figure demande de la diplomatie et du doigté : un client mécontent sera très vite un client perdu.

On va donc faire preuve d'imagination et être créatif afin de proposer des alternatives attrayantes, mais dont les risques seront contrôlables. Par exemple, la mise en place d'un prototype et/ou d'un Produit Minimum Viable.

Minimum Viable Product (MVP)

Souvent utilisé pour les projets Agiles, le MVP est une version du produit final, avec le minimum suffisant de fonctionnalités qui permet d'avoir un maximum de feedbacks des utilisateurs.

Le recours au MVP est une approche positive de ce type de problème, car il va nécessiter l'implication du client dès le début de la phase d'exécution et pendant les tests.

C'est un des nombreux cas où le mariage de méthodologies en cascade et agile vont nous permettre de livrer des solutions en tranches successives, permettant à la fois de respecter un cahier des charges et de délivrer des parties essentielles du produit dans des plannings serrés.

De plus, le client étant impliqué très tôt dans le projet, il peut suivre son évolution ainsi que son adéquation aux besoins de son entreprise.

Ici encore, on favorisera une approche permettant de retirer des bénéfices non négligeables d'une situation difficile au départ.

2 Le client exige une livraison plus rapide

En plus de l'approche expliquée ci-dessus, nous avons la possibilité de proposer au client des alternatives dont il devra choisir et accepter les conséquences :

On augmente les ressources ou le temps de travail

Évidemment, on peut augmenter le nombre de ressources assignées au projet, ou alors augmenter le temps de travail (quoique cette dernière solution ne puisse être qu'une mesure temporaire – et pas la meilleure).

Mais bien sûr, tout cela a un prix, qu'il faudra estimer avec le plus de précision possible et comparer avec les bénéfices – qui eux souvent restent inchangés.

Le client devra donc accepter un impact conséquent sur la contrainte Coût.
Et vous-même, une refonte du planning détaillé.

On réduit le périmètre

On part ici du principe que le client refuse une augmentation du budget assigné au projet.

Il nous reste donc l'option de réduire le périmètre, ce qui nous permettrait de délivrer selon le budget et le temps – mais avec des fonctionnalités réduites.

Si ce genre de compromis est accepté, il est rare que les résultats du projet soient au niveau des attentes. Il est alors probable que le projet et son budget soient étendus ou qu'un projet complet le suive afin de compléter le produit ou service selon les idées d'origine.

Pour faire accepter une réduction du périmètre, il faudra tout d'abord comprendre quelles sont les fonctionnalités essentielles du produit, c'est à dire les éléments non négociables qui resteront partie intégrante du périmètre.

C'est ce qu'on **DOIT** avoir.

On va ensuite examiner et catégoriser les fonctionnalités restantes en deux listes bien distinctes : ce que l'on **DEVRAIT** avoir et ce que l'on **POURRAIT** avoir, ce qui peut être retiré du périmètre sans trop d'impact négatif.

Ces trois catégories seront discutées avec le client et il en ressortira une liste de DOIT et DEVRAIT qui constituera notre nouveau périmètre.

Il ne nous reste plus qu'à **mettre à jour le registre des changements** et à refaire un planning qui sera présenté et accepté par le comité de direction avant de continuer le projet.

3 Le projet prend du retard

Il y a plein de bonnes ou moins bonnes raisons pour que ce cas de figure arrive à un projet :

- Mauvaise coordination des équipes
- Maladie (qui avait prévu Covid-19 dans son registre des risques ?)
- Vacances mal planifiées (voire pas du tout)
- Et bien d'autres

Ce retard doit être communiqué au comité de pilotage dès que son impact devient difficile ou impossible à contrôler.

Le comité de pilotage doit être au courant car, quoi qu'il arrive, ce sera aux dirigeants de décider de la marche à suivre :

- Augmenter les ressources ou le temps de travail (et donc les coûts)

Ou

- Accepter que le projet ne soit pas livré dans les délais négociés jusqu'ici

Votre implication en tant que chef de projet dans cette décision sera de préparer une analyse complète de la situation et de la source des problèmes, et de faire des recommandations.

  - Quel sera l'impact de l'augmentation des ressources ou du temps de travail ? Quels sont les risques associés ?
  - Quel est l'impact d'un retard du projet sur les coûts et les bénéfices ? Quels sont les risques ? Que se passera-t-il si la situation empire ?

Forts de ces informations essentielles, le comité de pilotage et vous-même pourrez décider de la meilleure solution pour le projet et l'entreprise.

4 Le projet est en avance

C'est tout le mal qu'on vous souhaite !

Si ce cas est en effet assez rare, il peut arriver que notre planning et notre gestion des risques ait été un peu trop « conservateurs ».

Si vous avez bien suivi notre article sur la gestion des risques, vous avez compris qu'un risque pouvait être négatif ou positif pour le projet.

Et si vous avez prévu les risques positifs, vous avez forcément prévu que votre projet pourrait aller plus vite que planifié. Vous avez donc défini votre Plan de Contingence - et gagné une médaille de lecteur assidu ;-)

Et si ce n'était pas prévu, cela reste une bonne nouvelle pour le projet.

Mais quelles sont les options ?

Tout d'abord, assurez-vous que « l'avance » ne provient pas d'une erreur de calcul, de périmètre ou de planification.

Ce serait trop bête d'annoncer une bonne nouvelle qui n'en est pas une.

Décidez de la clôture du projet

Si cela se confirme, vous pouvez décider, avec le comité de pilotage, de terminer et de clôturer le projet plus tôt que prévu.

Gagnez du temps pour de l'assurance qualité

Vous avez aussi la possibilité d'y ajouter des périodes de test et validation, afin d'utiliser le temps gagné à l'assurance qualité. C'est toujours du temps bien investi.

Revenez sur le traitement des demandes refusées

Vous pouvez aussi examiner les demandes refusées jusque-là et décider d'augmenter le périmètre en fonction du temps qu'il vous reste.

Gagnez du temps pour la formation

Enfin, vous pouvez utiliser ce temps pour affiner et compléter le matériel de formation, augmenter les sessions et/ou leur durée.

Tant de choses qui peuvent ajouter encore plus de prestige à votre projet.

Dans tous les cas, il serait improductif de passer cette bonne nouvelle sous silence !

Chapitre 4 - Problèmes liés au coût du projet

Vos dépenses s'envolent

Autre classique de la gestion de projet, les budgets qui deviennent incontrôlables sont souvent liés à de multiples problèmes et en tant que chef de projet, votre responsabilité est engagée.

Pour pouvoir reprendre le contrôle du projet et de son budget, il est indispensable de trouver au plus tôt quelles sont les circonstances qui ont mené à cette situation.

Parmi les plus fréquentes, on trouve :

- **Mauvaises estimations de départ**
- **Périmètre mal cadré**
- **Exigences de parties-prenantes-clés hors périmètre**
- **Coût des intervenants externes**
- **Mauvaise gestion administrative et financière**
- **Et bien d'autres…**

Et parfois aussi une somme de tous les exemples ci-dessus.

Il arrive que les enjeux business soient tels que ces écarts budgétaires soient acceptés par la direction de l'entreprise.

Mais même dans de tels cas, il est indispensable d'en cerner les sources et de les garder sous contrôle.

C'est donc à vous de comprendre et de documenter tous les éléments qui doivent être corrigés – de les résumer et d'en faire part au comité de pilotage.

Il est primordial d'être totalement transparent car bien souvent les raisons multiples nécessitent le support et l'intervention des membres du comité de pilotage – qui partagent avec vous cette responsabilité.

Reprenons les points ci-dessus et analysons quelques pistes de correction :

1 Mauvaises estimations de départ

Lors des estimations, il est courant d'être le plus optimiste possible.

C'est une arme à double tranchant car s'il augmente les chances de voir accepter le projet, cet optimisme peut se retourner contre vous si les risques n'avaient pas été mesurés à leur juste valeur.

💡 Refaites les estimations des coûts

Il y a deux choses à faire pour éviter les estimations trop optimistes :

- Prendre un deuxième avis
- Prévoir de se tromper dans notre registre des risques

Mais puisque dans notre cas ce risque est devenu un problème, il faut repasser par la case Estimation et recalculer le EAC (Estimate At Completion ou Estimation budgétaire en fin de projet).

N'essayez pas d'obtenir une succession de multiples rallonges financières, cela ne ferait qu'entamer les finances de l'entreprise – et la confiance du comité de pilotage.

Refaites une estimation complète, faites-là approuver et reprenez le contrôle de votre projet.

2 Périmètre mal cadré

Reprenez votre Cahier des Charges et comparez votre périmètre actuel par rapport aux accords initiaux.

Il y a fort à parier que certaines fonctions de base aient été « plaquées or » par les équipes ou à la demande de certaines parties prenantes.

Ce n'est pas toujours un mal : il se peut que durant la mise en place du prototype, nous ayons découvert qu'une de nos hypothèses de départ était erronée et que des corrections étaient devenues indispensables.

Mais avons-nous mis à jour nos estimations et sont-elles approuvées par le comité de pilotage?

Recadrer le périmètre et le faire valider

Dans tous les cas, il est nécessaire de recadrer le périmètre, d'en calculer l'impact sur la triple contrainte et de faire accepter le nouveau plan par le comité de pilotage.

A partir de ce nouveau départ, chaque partie prenante – interne ou externe à l'équipe - doit comprendre la nécessité de communiquer tout écart par rapport aux (nouveaux) accords.

3 Exigences de parties-prenantes clés hors périmètre

Si ce point ressemble très fort au point précédent et qu'il se résout en grande partie de la même manière, il a comme spécificité que l'écart vient d'un membre de la direction et/ou d'un membre du comité de pilotage du projet. Et que ce type de demande est soumis à de très fortes pressions.

Sollicitez le Copil pour prendre une décision

Si, en tant que chef de projet, vous devez porter le problème à l'attention des parties prenantes, il est souvent nécessaire de convoquer le comité de pilotage afin de statuer ensemble de la marche à suivre.

La demande peut être justifiée et le comité donnera son accord pour les coûts additionnels.

Mais parfois, le refus devra venir du comité de manière à être entériné et à éviter toute discussion postérieure.

4 Coût des intervenants externes

Si les coûts internes sont relativement faciles à contrôler, une gestion fine des coûts externes (sociétés de service, tierces parties, fournisseurs…) est nécessaire au contrôle du budget.

Les problèmes les plus courants étant les retards de livraison qui impactent le plan initial ou des coûts ne correspondant pas aux contrats.

Comme il s'agit de fournisseurs, votre département Achats devra être impliqué dans les négociations.

Au départ du projet, vous aurez négocié un contrat, soit à prix fixe (afin de contrôler les coûts), soit à la tâche (avec l'espoir de contrôler le temps, sinon le coût).

Prévoyez des clauses contraignantes dans les contrats

La première recommandation que nous puissions vous faire est de prévoir dans tous vos contrats des clauses contraignantes en termes de coûts et de délais.

Cela sera par exemple des dates limites, des plafonds de coût, des obligations de résultats, des astreintes journalières etc.

Vos acheteurs ont été formés pour établir et négocier ce genre de contrat qui peut vous éviter bien des maux de tête.

Si c'est à vous de contrôler que tout se passe bien, n'hésitez pas à faire appel à ces experts pour remettre vos coûts externes sur le droit chemin.

5 Mauvaise gestion administrative et financière

Un bon chef de projet n'est pas forcément expert financier.

💡 Faites vous aider par un expert financier

Il est donc fortement conseillé d'avoir dans votre équipe quelqu'un qui vous secondera dans la gestion financière de votre initiative.

Et nous avons vu dans l'exemple des intervenants externes que cela ne concerne pas uniquement le budget du projet lui-même.

Par exemple, même si on s'est mis d'accord sur une enveloppe globale, les fonds devront être libérés à temps pour chaque phase de votre projet.

La partie financière est donc étroitement liée au planning du projet, et lorsque les fonds ne sont pas disponibles, le projet peut devoir être «mis en pause».

De plus, pour connaître le coût actuel, il est nécessaire d'avoir une visibilité complète sur les coûts des salaires, les coûts externes, les coûts récurrents et les projections.

Faites des estimations régulières des dépenses

La projection, l'estimation régulière du coût réel en fin de projet, est un élément important d'une bonne gestion afin de prendre les bonnes décisions au bon moment.

Faites un rapport régulier des dépenses officielles et non officielles, des projections de chaque équipe et chaque partie impliquée dans votre projet.

Si ces rapports n'évitent pas tous les écueils, un suivi régulier vous permettra d'identifier très tôt un risque de dérapage et donc de le corriger avant qu'il ne devienne un obstacle insurmontable.

6 Les dépenses sont moindres que prévu

Si cela semble à priori une bonne nouvelle, attention aux véritables raisons de cette constatation.

En effet, dépenser moins que prévu peut signifier que vous avancez plus lentement que prévu dans votre projet : **Avez-vous vérifié où vous en êtes par rapport au plan ?**

Référez-vous à la valeur acquise de votre projet

La **Valeur Acquise** de votre projet est-elle au niveau des prévisions à ce niveau du développement ?

Si la réponse est oui, réjouissez-vous, mais pas trop. Ne libérez pas les fonds avant la fin du projet car il peut se passer de nombreuses circonstances où les sommes ainsi disponibles vous permettront, soit de résoudre des problèmes, soit d'augmenter la qualité de votre produit fini.

7 Manque de visibilité sur le budget

Obtenez l'aide d'un expert financier

Comme déjà suggéré dans le problème précédent, il est bon d'avoir dans son équipe un expert financier qui vous aidera à obtenir cette visibilité.

Si personne ne peut être assigné à plein temps ni même à temps partiel, assurez-vous d'avoir une personne de contact ayant l'expertise dont vous avez besoin.

Mener un projet sans visibilité financière, c'est comme conduire une voiture sans jauge à essence. Vous ne saurez pas si vous allez atteindre votre destination avant de l'avoir atteinte ou d'être tombé en panne d'essence. Et cela rend le voyage très inconfortable.

Comment savoir si vous arriverez à bon terme sans cette information ?

Faites un suivi de budget

Ce suivi est une des prérogatives du chef de projet et si cela s'avère difficile, n'hésitez pas à faire appel à votre Sponsor afin d'organiser une visibilité périodique des témoins de contrôle du projet.

Vous ne prendriez pas le risque de faire un grand voyage avec une voiture sans jauge et témoins de contrôle ? Alors, insistez pour pouvoir gérer votre projet dans les meilleures conditions.

N'hésitez pas à utiliser la métaphore ci-dessus, elle a l'avantage d'être comprise par tous.

Chapitre 6 - Problèmes liés à la qualité du projet

1 Le client refuse le produit

Le cauchemar de tout chef de projet.

Si ce type de situation est beaucoup moins fréquent dans les projets en mode agile car le client fait partie intégrante des revues ou démonstrations, il peut arriver que le client final refuse le produit pour de bonnes ou de moins bonnes raisons.

Mais lorsque ce problème intervient dans un projet en cascade, des semaines, mois et parfois années de travail vont être remises en question. L'impact peut alors être extrêmement important pour l'entreprise.

Référez-vous à la charte de projet et au cahier des charges

Si nous avons une Charte et un Cahier des Charges approuvés, nous allons revenir à ces documents afin de comprendre où et quand nous nous sommes éloignés de notre cible.

Nous allons aussi reprendre et analyser en détail les termes et le contenu du contrat.

Sans ces documents, les négociations vont s'avérer longues et difficiles.

Soit nous avons respecté nos engagements et délivré selon les accords, soit un changement incontrôlé est survenu pendant son exécution et les risques qui y étaient liés ont été ignorés ou sous-estimés.

Et en parlant de risques, ce risque doit faire partie intégrante de tout **Registre des Risques**, c'est-à-dire qu'idéalement des mesures de correction et un plan de contingence devraient avoir étés prévus.

Les négociations avec le client devront se faire avec l'aide du chef de projet, mais être dirigées par les équipes Légales et les représentants du comité de pilotage, y compris le Sponsor du projet.

En effet, le problème et sa solution dépassent les compétences et les prérogatives du seul chef de projet.

2 Le client remonte des non-conformités qui s'avèrent être des demandes hors périmètre

Il ne s'agit pas ici d'un refus du produit fini mais de retour du client pendant les phases de validation.

Le titre fait bien la différence entre les non-conformités – c'est-à-dire une mécompréhension entre le client et l'équipe projet – et les demandes hors périmètre.

💡 Examinez les demandes qui semblent hors-périmètre

Les demandes hors-périmètre devraient être identifiées par l'examen du Cahier des Charges initial, complété par les demandes de changements approuvées par le client et le comité de pilotage.

C'est la base sur laquelle on va examiner avec le client la marche à suivre avec ces nouvelles demandes et leur impact sur la triple contrainte (notamment les coûts et les délais).

Les demandes qui surviennent pendant la phase finale d'un projet – ici la phase de test/validation – ont souvent un impact non négligeable sur les coûts.

La mise en place d'une extension de projet est souvent la solution pour ne pas retarder la partie qui est prête à être livrée.

Analysez et intégrez les problèmes de non-conformité

Les problèmes de non-conformité évoqués plus haut feront l'objet d'estimations et devront être intégrés dans le projet, car ici le client nous demande de corriger des erreurs probablement dues à nos équipes ou à un problème de communication.

3 Le nombre de corrections explose

On avait certainement à peine survolé le Cahier des Charges si ce type de problème arrive.

Cela peut aussi arriver lorsque la période d'Initialisation et de Planification sont très éloignées de la date du démarrage de l'Exécution.

C'est un problème trop fréquent pour les gros projets nécessitant des financements bancaires, des approbations d'organismes officiels et/ou des longues périodes de négociations contractuelles.

Quand ces périodes sont très longues, la situation a changé, les besoins ont évolué et il fallait revalider le Cahier des Charges à tout le moins.

On a donc développé les solutions sur des informations incomplètes ou erronées – et l'on s'en rend compte lors des tests et de la validation.

Analysez et assumez les corrections

Seul remède : corriger et refaire. Et accepter une explosion des dépenses.

Même si la responsabilité est partagée entre l'entreprise et le client, il est difficile de faire supporter au client le poids de ces changements, car ils sont soit dus à notre équipe projet, soit au manque de vérification nécessaire lors de la reprise après les négociations.

...Et cela était notre responsabilité de chef de projet!

4 Je fais face à des défauts au moment de la livraison

On ne le souhaite à personne. Les défauts au moment de la livraison auraient pu être évités par une préparation des tests et une validation par le client bien avant la livraison.

Prévoyez des périodes de test dans votre plan de projet

Un plan de projet doit prévoir des périodes de tests/validations/corrections **deux à trois fois supérieures** à la période de développement.

C'est exagéré me direz-vous ?

Malheureusement, aussi fantastiques que soient nos équipes de développement, nous sommes tous humains. Et les développements qui fonctionnement du premier coup sont un mirage.

Ne jamais donc sous-estimer les tests et cette période nécessaire à construire un produit de qualité supérieure pour vos clients.

Soit, nous n'avons dans ce cas-ci pas le niveau de qualité nécessaire à une mise en production.

Ce problème va évidemment retarder la mise en place finale et nécessiter une rallonge budgétaire à faire accepter par le comité de pilotage.

Nul doute que le client refusera de prendre les coûts additionnels à sa charge, il faudra trouver un compromis.

Une chose est sûre : les corrections sont nécessaires, car à ce stade du projet il est difficile d'annuler sans très gros impact sur les capacités financières.

Cogitez en équipe à des solutions

À nous donc de faire preuve de créativité pour sortir de cette situation au plus tôt et au moindre coût.

Rassemblez les experts de votre équipe et réfléchissez tous ensemble à la manière la plus élégante de régler ces problèmes au plus tôt.

Ici encore, c'est un travail d'équipe. Vous vous apercevrez que c'est dans les problèmes que les équipes sont les plus soudées et sont capables de grandes choses.

Il y a toujours des aspects positifs dans les crises.

Chapitre 7 - Problèmes liés aux ressources humaines du projet

1 Les ressources promises sont indisponibles

Probablement l'un des problèmes les plus fréquents, l'assignation de ressources n'est malheureusement pas couverte par la documentation habituelle.

C'est particulièrement vrai dans les organisations matricielles, car les membres assignés à votre projet continuent de répondre à leurs départements respectifs et sont assignés au projet à temps partiel.

Lorsque tout se déroule tel que prévu, le planning est développé en fonction de la disponibilité et un contrôle régulier assure un bon fonctionnement de l'équipe.

Mais parfois, un projet prioritaire ou une urgence survient et la ressource assignée **change de priorité**, parfois avec votre accord, mais souvent de manière unilatérale (après tout, la voie hiérarchique n'a pas changé).

Vous voilà donc face à un problème dont il faut gérer l'impact.

Prévoyez une solution dans votre registre des risques

Ici aussi, ce problème étant fréquent, il est fortement recommandé de prévoir une telle situation dans votre Registre de Risques, en négociant les mesures de correction et de contingence.

On peut, par exemple, prévoir des **ressources de remplacement** (back-up). Ce qui aura l'avantage de pouvoir être applicable aussi en cas de maladie ou pendant la période de vacances.

On peut aussi adapter le planning détaillé afin de réduire l'impact de cette absence.

Et puis, l'on peut trouver des compromis avec les responsables de département afin de réduire l'impact sur les projets et sur le travail opérationnel.

Une bonne communication et des discussions ouvertes et transparentes permettent souvent de résoudre les situations les plus complexes.

Après tout, on ne vous a pas enlevé les ressources pour vous ennuyer, il n'y a pas qu'un seul projet dans l'entreprise et les projets n'ont pas fait disparaître le travail journalier et opérationnel.

Lorsque chacun aura accepté les contraintes de l'autre, des solutions pourront être trouvées.

2 Certains membres de l'équipe manquent d'expertise

Bien sûr tout le monde veut s'entourer d'experts et parfois le manque d'expertise nuit au bon fonctionnement de l'équipe.

Si vous ne pouvez pas obtenir les experts dont vous avez besoin, essayez d'obtenir leur disponibilité ponctuelle afin de faire évoluer les membres de votre équipe.

Un seul expert dans son domaine, que plusieurs services ou projets tentent de s'arracher est un risque réel pour l'entreprise.

Partagez les compétences d'un expert avec votre équipe

La vraie solution ne réside pas dans l'assignation de cet(te) expert(e) à votre équipe, mais dans le partage de son expertise de manière à utiliser les compétences et à étendre les possibilités de support à l'intérieur de l'entreprise.

Je préfère souvent travailler avec quelqu'un dont la **motivation dépasse les compétences** parce que cette personne sera bien sûr aussi toute disposée à apprendre, évoluer et grandir.

Votre problème malheureusement est immédiat. Il vous faudra donc négocier une disponibilité de **l'expert à temps partiel** ainsi qu'un programme de formation.

Le chef de projet a souvent tendance à sous-estimer l'apport des autres départements de l'entreprise – comme les Ressources Humaines, les Finances ou les Achats qui pourraient trouver parfois assez rapidement de l'aide ponctuelle payante.

Un expert externe qui vous apporte une aide ponctuelle payante peut parfois débloquer une situation difficile.

Comme tout problème, tout dépendra de l'équilibre et du compromis qui permettra à tous de trouver plus d'avantages que d'inconvénients dans l'accord passé.

3 Les membres de l'équipe s'en vont l'un après l'autre

Il est important, lorsque cette situation se produit, d'en comprendre les causes et les sources - certaines vont se résoudre de manière différente.

Prenez le temps de parler avec les « partants » car leur départ n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Et vous n'arrêterez « l'hémorragie » que lorsque vous aurez compris ce qui provoque ces départs.

Passons en revue quelques-unes de ces raisons :

Le salaire

C'est encore et toujours une des raisons principales des démissions car certaines expertises sont très recherchées sur le marché.

Pensez à motiver vos équipes

Négociez les salaires avec les Ressources Humaines en fonction du marché – c'est assez facile de rechercher les salaires moyens sur internet et de les comparer aux salaires de l'entreprise.

Attention toutefois à ne pas créer des disparités trop fortes à l'intérieur de votre équipe, car vous créeriez un nouveau problème.

J'ai vu souvent ce problème survenir en fin de projet. En effet, les membres de l'équipe vont évoluer, apprendre, grandir pendant le projet. Et forcément, attirer les « chasseurs de têtes ».

Prévoyez ce cas de figure dans votre gestion des risques et mettez-vous d'accord avec vos équipes pour ne quitter le projet qu'après la livraison finale. Ou prévoyez des plans de carrière afin de faire évoluer les meilleurs éléments dans votre entreprise.

Bien sûr, nous voulons tous bien gagner notre vie. Mais souvent, on est attirés par d'autres aspects de l'offre, comme les possibilités d'évolutions ou l'ambiance de travail.

Pensez à tout cela quand vous parlerez à vos équipes et n'oubliez pas que certains membres de l'équipe vont grandir et s'épanouir pendant le projet pour devenir les dirigeants de demain.

Les perspectives d'évolution

Comme déjà expliqué ci-dessus, certains membres de l'équipe vont se révéler comme de véritables moteurs du projet et de l'équipe.

C'est une constante que j'ai retrouvée dans tous les gros projets menés jusqu'ici.

💡 Envisagez ces perspectives d'évolution

Donnez à ces personnes des perspectives d'évolution, dès que vous les aurez identifiées.

Grâce à elles, votre projet deviendra plus facile à gérer. Leur motivation poussera les autres vers l'avant et l'ambiance du projet s'en trouvera transformée.

N'attendez pas qu'une société concurrente identifie ces potentiels avant vous et vous prive d'un élément essentiel pour votre projet et l'entreprise.

Le stress, la pression

La tenue des délais ne peut se faire au détriment du bien-être de l'équipe. Un équilibre travail/vie privée est nécessaire tout au long marathon que sont certains projets.

Je ne parle pas ici des périodes courtes, comme la mise en production qui souvent demande de longues heures de travail continu, mais très ciblées.

Je parle ici de planifications trop optimistes, qui mettent une pression insoutenable sur l'équipe pendant des semaines voire des mois.

Nous savons tous que les plannings trop optimistes sont très difficiles et parfois impossibles à tenir.

💡 Faites part des risques des attentes exagérées au Copil

Alors, pourquoi ne pas en discuter ouvertement avec le comité de pilotage et expliquer les risques majeurs d'attentes exagérées ?

C'est à vous, en tant que chef de projet, de protéger les membres de vos équipes de délais trop courts, de charges de travail trop élevées.

Sans cela, certaines personnes n'hésiteront pas à quitter le projet précipitamment afin de se protéger eux-mêmes et leur famille.

Le manque d'intérêt

À l'inverse du stress, il existe aussi le manque d'intérêt par rapport au projet ou le manque de travail.

💡 Tâchez de bien engager les membres de l'équipe

Veillez à ne pas oublier ces personnes assignées à votre projet, mais n'ayant pas encore compris leur rôle et leur utilité.

Avez-vous demandé leur assignation trop tôt ?

Il est important que chaque membre de l'équipe comprenne sa place dans cette équipe et sa contribution au produit final.

Sans cela, la personne peut décider de quitter le projet alors que vous en aurez impérativement besoin dans les phases qui suivent.

Auriez-vous demandé son assignation si ce n'était pas le cas ?

Chapitre 8 - Problèmes liés à la communication du projet

1 La résistance au changement se fait plus dure

C'est humain. Certaines personnes se sentent très bien dans leur zone de confort et ne souhaitent pas changer.

L'attractivité du changement leur reste souvent étrangère et nous prévoyons souvent ce genre de réaction dans nos plans de communication.

Il peut arriver parfois que ces « résistants » soient très respectés dans l'entreprise et que leur résistance trouve un écho chez leurs sympathisants.

Il peut arriver aussi que le plan de communication soit inexistant ou mal conçu. Dans ce cas-là, la résistance au changement sera plus dure, car les bénéfices du projet ne sont pas compris, pas acceptés.

Comprenez les causes de la résistance au changement

Il est essentiel de toujours aborder ce problème avec le plus grand sérieux, car à quoi servira votre produit si personne n'en veut ?

Tous les chefs de projets ne sont pas forcément d'excellents communicateurs et pour ceux-là, je ne peux que recommander de travailler avec un(e) responsable du changement et de la communication.

Si cette personne n'avait pas été assignée au début du projet, il est essentiel de trouver de l'aide maintenant, avant que ce problème ne vienne bloquer complètement le projet.

Il faudra analyser pourquoi cette résistance se fait plus dure. Comprendre ce qui motive cette résistance et comment trouver des solutions adaptées.

Sollicitez l'aide des décisionnaires et experts

Il y a souvent dans l'entreprise, des dirigeants qui sont reconnus et respectés de tous. C'est avec eux et l'aide des ressources humaine – et parfois de consultants externes – que nous allons développer un plan d'attaque et peut-être un plan de projet revu et corrigé.

N'hésitez pas à vous faire aider lorsque vous rencontrez ce problème, parlez-en avec votre comité de pilotage et trouvez ensemble un plan d'action.

2 Je manque de support

Le manque de support ou de sponsor peut s'avérer pesant pour un(e) chef de projet car le sponsor doit être le lien avec les dirigeants de la société et donc un élément essentiel de la prise de décision.

Mais le titre de ce problème en cache quatre différents :

- Le sponsor du projet a changé de poste
- Le sponsor n'est pas impliqué
- Le projet n'a pas de sponsor
- Le client est exigeant

Voyons-les séparément.

2.1 Le sponsor a changé de poste

Ce changement doit être discuté en comité de pilotage car le sponsor doit être remplacé.

Le nouveau sponsor devra prévoir une période de transition avec l'ancien sponsor ainsi qu'un accord de disponibilité en cas de problème majeur.

Ne pas assigner un nouveau sponsor est un risque majeur pour le projet et donc doit être mitigé et avoir un plan de contingence.

2.2 Il n'y a pas de sponsor

Vous l'avez compris : les projets majeurs nécessitent un sponsor et celui-ci fera partie du comité de pilotage.

Si les projets mineurs ou moyens peuvent éventuellement s'en passer, l'absence de sponsor sur un projet majeur est un risque bloquant et ses conséquences sont à la charge du comité de pilotage.

Ce risque sera documenté et ses impacts clairement exposés avant de démarrer l'exécution du projet.

2.2 Le sponsor n'est pas impliqué

Pour éviter ce problème – et les problèmes de sponsoring en général - je conseille souvent de former les parties-prenantes-clés à une initiation à la gestion de projet.

Cette formation adaptée permet aux dirigeants de comprendre le rôle du chef de projet et le rôle du sponsor en particulier dans la bonne marche du projet.

Pour cela, il est indispensable de comprendre les phases d'un projet et leur but, de partager les terminologies spécifiques et les moments où le support devient indispensable à la bonne gestion et au succès du projet.

Cette formation spécifique est très efficace pour aligner les parties prenantes sur le déroulement d'un projet et peut contenir de petits Quiz permettant de s'assurer que les théories ont bien été comprises et acceptées.

On va aussi prévoir des réunions régulières, face à face, avec le/la sponsor afin d'éveiller son intérêt et sa compréhension.

Enfin, lors de ces réunions, on partagera les buts communs et le travail d'équipe pour la préparation des supports de réunions de pilotage et des jalons.

Ces approches se sont toujours révélées très efficaces.

2.3 Le sponsor est un client exigeant

Croyez-moi, avoir un client exigeant est parfois préférable à un projet sans sponsor. Même si cette situation est fortement inconfortable.

Cela peut sembler être un commentaire bateau, mais les personnes exigeantes m'ont toujours aidé à m'améliorer. Et c'est l'approche que vous devez avoir.

Parce que le client exigeant peut changer d'avis, les documents incontournables tels que la Charte Projet, le Cahier des Charges, les registres des Risques et des Problèmes doivent être des documents aussi solides et complets que possible.

Chaque document sera créé ensemble. Chaque modification fera l'objet d'une procédure d'accord.

Chaque impact sur la Triple Contrainte (Temps, Périmètre, Budget) sera approuvé officiellement par les parties.

Bien sûr cela augmentera le travail administratif du chef de projet – mais c'est indispensable à la bonne relation client/fournisseur et surtout à la qualité du travail fourni par le projet.

Alors, soyez positifs car il y a de grandes chance qu'un client exigeant devienne la clé d'un projet réussi lorsque vous aurez fait de ce risque un véritable atout.

2.4 Personne ne veut de ce projet : comment survivre en tant que Chef de Projet ?

Si personne n'en veut, pourquoi le faire ? Y a-t-il vraiment une valeur ajoutée?

Il vaut parfois mieux refuser un projet pour de bonnes raisons que d'en accepter un pour de mauvaises raisons.

Cela dit, si ce projet a vraiment de la valeur pour l'entreprise : battez-vous, expliquez, ralliez à vous des dirigeants qui partagent votre enthousiasme et ensemble, communiquez comment et pourquoi le projet a vu le jour, comment il va changer la donne et profiter à toute l'entreprise.

On retrouve ici encore l'importance d'un sponsor impliqué et actif.

Chapitre 9 - Problèmes liés à la gestion des risques du projet

1 On fait face à un problème après l'autre

La phase d'identification et d'analyse des risques n'a pas été suffisamment élaborée.

Soit, vous n'avez pas du tout de registre des risques, soit ce travail a été bâclé.

Désolé d'être aussi brutal, mais une vraie gestion des risques est un des fondamentaux de la gestion de projet.

Il n'existe pas de projet qui se déroule sans accroc. Et ce n'est pas parce que le projet précédent s'est bien passé, que celui-ci sera tout rose.

On le voit dans cet ebook : tellement de choses peuvent arriver, qu'il est essentiel d'avoir prévu un maximum de scenarios catastrophes pour vous assurer d'avoir la bonne réponse lorsque le risque deviendra un problème pour votre projet.

Documentez les risques et problèmes

Un registre des risques peut aussi (doit ?) être fait en cours de projet afin d'éviter d'autres catastrophes.

Mais, en attendant, le(s) problème(s) est (sont) là et doit/doivent être réglé(s) de manière urgente.

Peu de problèmes seront réglés au niveau du chef de projet. La plupart du temps, il sera nécessaire de rassembler une partie de l'équipe et de discuter ensemble des solutions rapides à mettre en place.

Assurez-vous que tout le monde est d'accord avec la solution – pas question de créer un problème interne en essayant de trouver une solution à un autre problème.

Faites participer le Comité de Pilotage

Le travail d'équipe demande l'implication de tous.

Certaines des solutions proposées devront être approuvées par le comité de pilotage. N'hésitez pas à organiser des réunions particulières et n'attendez pas le comité du mois prochain pour en discuter : il pourrait être trop tard.

Par expérience, les dirigeants apprécient lorsqu'on leur demande de prendre des décisions, même difficiles. N'est-ce pas après tout une des prérogatives du dirigeant ?

Réglez donc tous ensemble les problèmes courants et dès que la tempête est passée, créer et maintenez votre registre des risques et des problèmes.
Celui-ci sera le bienvenu à la prochaine crise.

2 J'avais bien prévu le risque, mais il est devenu un problème malgré tout

Tout d'abord : félicitations ! Vous avez pensé à la gestion des risques et celui-ci a bien été documenté.

Et bien sûr, avoir prévu un risque, et même l'avoir mitigé, n'empêche pas toujours ce risque de devenir réalité et un problème pour le projet.

Peut-être que les contre-mesures n'étaient pas suffisantes, peut-être est-ce tout simplement la fatalité. Un problème dans un projet est souvent une chose normale.

Suivez le plan de contingence mis en place

Si ce risque était dans votre registre, mettez simplement en place le plan de contingence prévu et suivez-le de près en le corrigeant si nécessaire.

Parfois le plan de contingence est insuffisant. Dans ce cas-ci aussi : rassemblez une partie de votre équipe et trouvez ensemble les meilleures solutions.

Et si vous pensez avoir trouvé la solution miracle : validez-la avec vos experts avant de vous lancer tête baissée. Travail d'équipe, toujours.

Documentez les leçons apprises

Notez les mesures et mettez à jour le registre afin de documenter les mesures de correction.

N'hésitez pas non plus à documenter ce problème et ses solutions dans les leçons apprises de votre projet pour que les projets futurs puissent éviter cet écueil.

3 Comment prévoir l'imprévisible ?

Soyez curieux. Lisez les faits divers. Parlez des problèmes rencontrés avec vos collègues et votre communauté.

Très peu de gens avaient prévu une pandémie (à part peut-être Bill Gates et de grandes têtes pensantes) – mais encore moins pouvaient prévoir les conséquences sur la vie quotidienne et les impacts économiques.

TOUT peut arriver.

Organisez des brainstormings

Faites une réunion et demandez aux membres de votre équipe de réfléchir aux conséquences potentielles d'événements hors du commun, tels que :

- Événements climatiques (inondations, tremblements de terre, tsunami, chaleur…)
- Géopolitiques (guerres, changement de régimes, grèves, attentats…)
- Financiers (crash boursier, bitcoin, rachat de société, faillite, inflation…)
- Organisationnels (réorganisation complète, changement de direction, licenciements…)
- Privés (ayant un impact sur le projet)
- Technologiques (pannes électriques, réseaux coupés, virus, chantage et intrusion…)
- Accidents (train, avion, camion, voiture…)
- Santé (virus, maladie, pandémie, air insalubre…)

Je peux vous assurer que de nombreux projets dans le monde ont été impactés par l'une ou plusieurs des suggestions ci-dessus.

On ne vous demande pas de les prévoir tous, mais soyez conscients des faiblesses de votre environnement de travail et de vos plans de secours.

Chapitre 9 - Problèmes liés aux approvisionnements du projet

1 Prix fixe ou facturation à la tâche ?

Pour ceux qui espéraient la réponse unique et universelle, je suis obligé de vous décevoir : la réponse dépend en effet de la situation.

Sachez tout d'abord que la société de services avec laquelle vous allez travailler doit, elle aussi, s'assurer de faire du bénéfice et pour cela, va prévoir un coussin de sécurité, quelle que soit son offre.

À vous de mesurer les risques de l'une ou de l'autre option :

- Le **prix fixe** est une assurance de votre côté de ne pas dépasser une enveloppe budgétaire précise. Pour cela, votre fournisseur va prendre une partie des risques de dérapage en acceptant une marge d'erreur en compensation d'un prix plus élevé.
- Avec la **facturation à la tâche**, c'est vous qui acceptez les risques de dérapage avec à la clé une possibilité de dépenses moins élevées.

Dans le premier cas, vous partagez les risques vers le fournisseur en échange d'une facture plus élevée, dans le deuxième, vous prenez les risques avec l'espoir de dépenser moins.

Et si ca se passe mal ?

Dans le cas d'un prix fixe, le fournisseur devra assumer ses responsabilités et les coûts associés.

Dans le cas d'une facture à la tâche, vous pouvez voir vos coûts s'envoler.

La solution ?

Faites une analyse des risques très détaillée et faites confiance à vos collègues du service Achats ainsi qu'à vos juristes.

En effet, tout va se jouer au niveau du contrat et de sa négociation.

Les sociétés de service ont en général des contrats « blindés » qui prévoient tous les cas de figure et limitent les impacts négatifs du prix fixe.

De même pour les facturations à la tâche: le périmètre sera entièrement cadré pour éviter tout dérapage.

De votre côté, assurez-vous que tous les risques sont bien documentés.

Parlez-en avec vos collègues et définissez ensemble le type de contrat idéal. Il peut par exemple contenir des clauses de réussite qui vont conditionner une partie des paiements ou de primes particulières, avec un prix de départ moins élevé.

Vous l'avez compris : la clé se trouve dans le travail collégial avec les services achats et légaux, afin de négocier la meilleure solution pour votre projet en particulier.

Faites-vous aider par des experts dans les négociations avec les fournisseurs.

2 Les performances des contractants ne sont pas au niveau des attentes

Malgré toute la minutie apportée au choix des tierces-parties, ce cas de figure peut arriver. Et cela fera partie des risques documentés dans votre Registre.

La clé ici est : la négociation

Je dois donc rebondir ici sur les recommandations précédentes :
la négociation des contrats par les services Achats et Juridique.

Parce que ce problème est (trop) fréquent, le contrat va prévoir cette situation ainsi que la conduite à adopter le cas échéant.

Et les réactions seront bien sûr adaptées au choix de contrat :

- Si vous êtes facturés à la tâche et que le contractant n'est pas au niveau des attentes, les coûts peuvent rapidement s'envoler. Il faut donc réagir immédiatement et insister pour obtenir un niveau de service à la hauteur des exigences contractuelles.
- Si vous êtes facturés au prix fixe, le risque est de voir votre projet s'éterniser – et donc vos bénéfices attendus reportés d'autant.

Comme pour le problème ci-dessus : ne restez pas seul pour résoudre ce problème.

À chacun son métier et les juristes et acheteurs sont formés à ce genre de négociations.

Une chose est sûre : il ne faut jamais laisser ce problème durer trop longtemps : votre projet pourrait faire face à un risque majeur qui peut impacter l'ensemble des équipes.

3 Conflit avec un fournisseur sur la qualité d'un livrable

Ce type de conflit peut envenimer toute relation client-fournisseur.

Il est généralement dû à une mauvaise définition du produit fini laissant la place aux interprétations.

Mettez en place un DOD (Definition Of Done)

Il est donc essentiel que pour chaque livrable, l'on ait documenté de manière détaillée les résultats attendus et les procédures de vérification de la conformité.

En management Agile, on, appelle cela « Definition of Done » et cela correspond au moment où le produit a été testé et peut être considéré comme terminé.

Sans cette documentation, les négociations vont s'éterniser, car chaque partie sera convaincue de sa bonne foi.

Si cette documentation de définition des besoins est disponible et que les tests de conformité sont clairs, le fournisseur devra bien sûr prendre à sa charge les corrections exigées.

Dans le cas contraire, un compromis devra être trouvé entre les deux parties, ce qui signifiera plus de travail pour l'une et un coût plus élevé pour l'autre.

Ici aussi, l'aide des Achats et de vos juristes sera indispensable pour régler le litige.

Pensez-donc à inclure ces descriptions, des attentes de livrables et des tests de conformité à vos cahiers des charges et à vos contrats afin d'éviter ce type de problème extrêmement grave en fin de projet.

4 Le coût des consultants explose

Dans ce cas-ci, nous assumons que nous avons opté pour une facturation à la tâche. Et que malheureusement la mise en place du produit s'est avérée beaucoup plus complexe que prévue.

Notre dépendance des consultants fait exploser les budgets et nous ne sommes pas encore en mesure de commencer les tests.

💡 Quelles sont les solutions ?

- Reprendre en interne le travail des consultants est difficile : nous n'avons pas les ressources internes pour continuer le développement
- Revoir le périmètre est une option : peut-être avons-nous débordé du cadre initial ?
- Analyser la facturation : correspond-elle aux prestations ? Les prestations correspondent-elles aux accords ?
- Renégocier les contrats et obtenir des fonds supplémentaires

La solution peut aussi être un ensemble des solutions ci-dessous :

💡 Prenez en compte les risques résiduels

Si vous devez renégocier les contrats, assurez-vous cette fois-ci que tous les risques seront pris en compte.

Avec les Achats et le service juridique, voyez quel nouveau contrat sera le mieux adapté à la situation.

Ici encore, place à la négociation. Car la situation n'est plus la même qu'au départ du projet.

Votre fournisseur et vous-même avez évolué ensemble dans cette mise en place et chacun a intérêt à trouver une solution acceptable pour les deux parties.

À partir d'ici, il faudra partager les risques résiduels avec le fournisseur pour le bien du projet et la satisfaction du client.

Contrôlez l'augmentation du budget et les engagements

Il est trop tard pour délivrer selon le budget initial.

Il est par contre essentiel de pouvoir rassurer le comité de pilotage sur le fait que l'augmentation du budget sera contrôlée et que les engagements des parties (fournisseurs/client) seront tenus.

Ces engagements seront donc documentés officiellement et approuvés par toutes les parties.

Chapitre 11 - Problèmes liés aux parties prenantes

1 L'obstruction

Si l'obstruction est une des manifestations de la résistance au changement, elle devient un véritable casse-tête pour le chef de projet lorsqu'elle vient d'une partie prenante-clé.

En effet, l'obstruction d'un chef de département peut avoir d'autres sources qu'une « simple » résistance.

Cela peut être une peur de perdre son poste, un refus catégorique de modifier son organisation qui fonctionne au mieux aujourd'hui ou toutes sortes d'autres raisons très personnelles.

Discutez du problème avec le sponsor et le Copil

L'obstruction d'une partie prenante clé ne peut se régler au niveau chef de projet.

Si vous avez la chance d'avoir un(e) Responsable du Changement, confiez-lui ce challenge.

Ce problème sera, dans tous les cas, discuté avec votre sponsor et le Comité de pilotage.

Parce que son impact sur le projet peut être extrêmement néfaste, l'obstruction doit être combattue par tous les moyens.

À commencer bien sûr par les explications des raisons qui ont amené la direction à mettre en place ce projet et en quoi il est bénéfique pour l'entreprise.

L'obstruction est souvent la manifestation d'une peur, d'une mécompréhension des bénéfices du projet.

Priorité donc à l'explication, à la discussion ouverte et à la compréhension mutuelle.

2 Les exigences irraisonnables

Pour beaucoup de parties prenantes, les projets sont une opportunité d'obtenir des avantages qu'ils ou elles n'obtiendraient pas en temps ordinaire.

💡 Référez-vous à la charte de projet

Il est donc important de « canaliser » les attentes dès le départ du projet. Et cela commence avec la Charte du projet qui va définir ce qui sera dans le périmètre, mais surtout ce qui ne sera pas dans le périmètre du projet.

Un point de départ solide pourra éviter bien des discussions futures.

Malgré tout, certaines parties prenantes auront tendance à avoir des exigences irraisonnables, qui de leur point de vue semblent tout à fait adaptées, mais qui du point de vue du projet sortent entièrement du périmètre initial.

Référez-vous également au cahier des charges

On a parlé de la Charte, premier document qui cadre le projet, il y aura aussi le Cahier des Charges, qui lui donnera beaucoup plus de détail sur ce qui sera mis en place.

Ce qui ne sera pas dans ce Cahier des Charges, sera donc hors périmètre.

Et tout changement à l'un ou l'autre de ces documents devra être approuvé par le Comité de pilotage.

Lorsque je rencontre ce type de discussions et que je rappelle les accords initiaux, je ne manque pas de noter ces nouvelles exigences, car elles peuvent éventuellement faire partie d'une version ultérieure – ce qui souvent permet de trouver un accord lors des discussions.

3 Les parties prenantes oubliées

Si souvent un oubli dans le **Registre des Parties Prenantes** a peu de conséquences, l'oubli d'une partie prenante clé peut s'avérer catastrophique.

En effet, on peut avoir oublié une personne, un service, voire un département qui sera directement impacté par les changements.

Si c'est le cas, la personne oubliée apprendra l'existence du projet de manière indirecte – ce qui ne fait jamais plaisir – et pourrait avoir des demandes tout à fait légitimes qui ne font pas à ce jour partie du cahier des charges.

On sera donc obligé de revoir des documents de base, comme la Charte et le Cahier des Charges – et accepter de devoir revoir les plans, le périmètre et peut-être le budget.

Puisqu'il s'agit d'une partie prenante clé, il faudra bien sûr aussi établir la communication, l'explication des avantages du projet, définir les besoins en termes de communication et peut-être en termes de ressources.

Restez en contact avec les parties prenantes

En attendant que la relation s'établisse et se stabilise, il sera important de garder un contact proche afin de créer le climat de confiance nécessaire au bon déroulement du projet.

On le voit, un « simple » oubli peut représenter beaucoup de travail supplémentaire et démontre l'utilité d'une Registre des Parties Prenantes complet et validé.

3 Les « franc-tireurs »

Malgré tous nos efforts de communication, il peut encore arriver qu'il reste des poches de résistance : les francs-tireurs.

Je les mets dans une catégorie à part car ces personnes peuvent être dangereuses : elles ont un discours positif mais des attitudes négatives voire destructrices.

Lorsque vous rencontrez ce genre d'attitude, il n'y a pas d'autre moyen à mes yeux que d'escalader le problème à la direction.

En expliquant de manière détaillée les conséquences que ces attitudes ont sur le projet.

Par exemple, un chef de département se montre très courtois envers le projet, mais bloque systématiquement toute implication de membres de son équipe.

Une autre ne répond à aucun message ou demande d'information. Un troisième vient d'acheter un logiciel qui fera double emploi avec celui de notre projet et réduira à néant les chances d'acceptation de changement.

Obtenez le support du sponsor ou du Copil

Il arrive rarement que les exemples ci-dessus se passent simultanément, mais il sera nécessaire d'obtenir le support de votre sponsor et du comité de direction pour en venir à bout.

Comme on peut s'en apercevoir tout au long de ce guide, beaucoup des problèmes traités auraient pu être évités ou tout au moins largement diminués grâce à quelques outils essentiels du chef de projet, comme la Charte, le Cahier des Charges, les registres des Risques et des Parties Prenantes.

Mais il n'existe pas de potion magique et il n'existe pas de projet cent pour cent dénué de problèmes.

Il existe par contre quelques clés qui vous ouvriront les portes de projets réussis :

- Travaillez avec les parties prenantes clés dès le départ afin d'être toujours alignés
- Soyez transparent dans votre communication
- Travaillez très étroitement avec votre Sponsor
- Sachez négocier et trouver des compromis acceptables pour tous
- N'assumez pas toutes les responsabilités : faites-vous aider :
  - Par le Sponsor
  - Par les Achats
  - Par les Services Juridiques
  - Par les Ressources Humaines
  - Etc
- Pour les plus gros problèmes, n'hésitez pas à faire un pas en arrière :
  - Arrêtez
  - Réfléchissez
  - Évaluez les options
  - Reprenez le cours du projet

Grâce à ces quelques clés, vous pourrez vous sortir de situations inconfortables, trouver ce qui a provoqué le problème, mettre en place les corrections nécessaires et reprendre le cours de votre projet.

A vous de jouer maintenant et bon vent à toutes vos initiatives !
